

新庁舎等建設工事の進捗状況について


南関町では、現庁舎が建設されてから50年以上が経過し、耐震性や老朽化などさまざまな課題を抱えていることから、まちづくり並びにまちの防災拠点として機能する役場新庁舎の建設に取り組んでいます。

新庁舎は、木造2階建ての増築棟の建設工事、旧南関高校校舎（県内では初めて熊本県より無償譲渡）を庁舎として活用する改修工事を行い、令和3年12月末の完成を目指しています。

令和2年6月から工事に着手しており、敷地内樹木の伐採、旧校舎の内装撤去及び一部解体工事が終了しています。11月からは木造の増築棟の建設に係る地盤改良や改修に係る足場組立工事などを行っています。現在、工事は順調に進んでおり、4月頃には増築棟の地上部分も徐々に立ち上がってくる予定です。

また、庁舎敷地内道路、来庁者駐車場も令和3年秋頃迄に完成を予定しています。

庁舎等建設工事の進捗に関しては町ホームページにも毎月掲載していますので是非ご覧ください。4月以降は広報なんかんにも随時掲載を行っていく予定です。

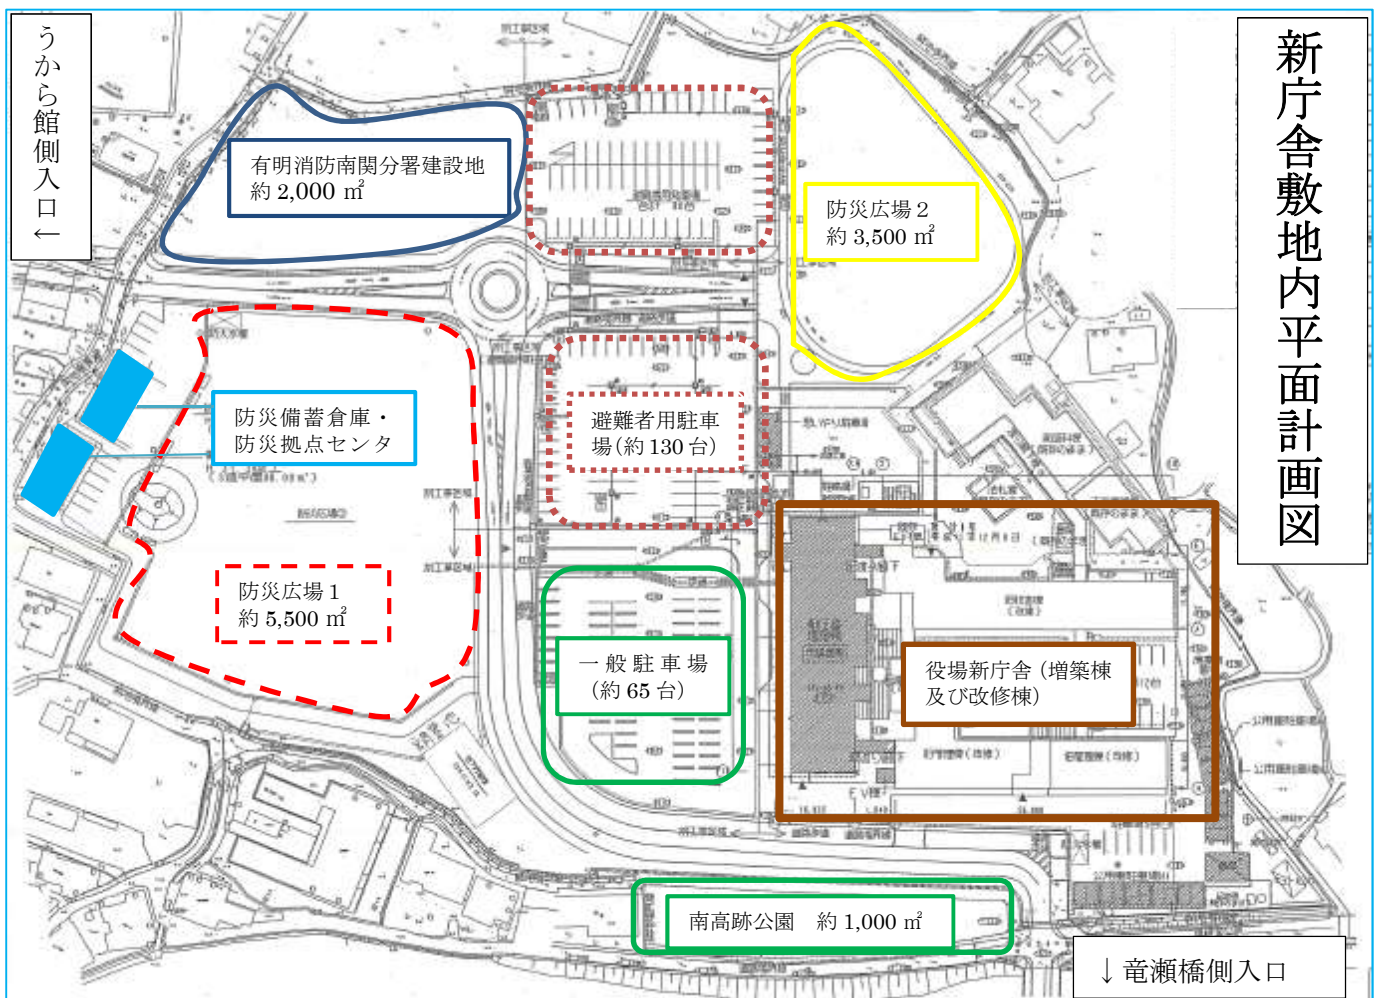

「新庁舎等建設現場見学会のお知らせ」

新庁舎等建設工事の現場見学会の開催を令和3年5月頃に予定しています。参加者募集方法の詳細に関しましては、4月頃に町広報や町ホームページでお知らせします。

※新庁舎等建設工事は事故が起こらないよう細心の注意を払って行っています。
新庁舎開庁まで敷地内への立ち入りはご遠慮ください。

「工事進捗状況写真」

(増築棟建設予定地：着工前)



(増築棟建設予定地：12月現在)



(旧校舎一部解体工事)



(旧校舎一部解体工事後)



(旧校舎内装撤去工事)



(庁舎敷地内道路：うから館側)

